


# 現場だより 8月度

工事名：朝倉1号汚水幹線管渠築造工事（R3-1）



## 工事概要

工事場所：高知県高知市朝倉本町二丁目  
工期：令和4年2月25日～令和4年10月12日  
工事内容：鋼製さや管推進工 汚水管推進工  
立坑工 人孔設置工 付帯工  
発注者：高知市上下水道局下水道整備課  
受注者：福留開発株式会社

## 事業内容



本工事は、生活環境の向上を目的として行う下水道工事です。無事故無災害で工事を完遂する為、接触事故等の防止、新型コロナウイルス感染防止、熱中症などへの対策を講じ、安全面や衛生面も徹底して進めています。また、現場の近隣には学校、病院、飲食店などがあり生活道及び通学路としてたくさんの方が利用されています。そのため施工期間中は、皆様の安全を考慮し通行制限を行う場合があります。

今後とも、皆様には大変ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

## 進捗状況

皆様のご協力もあり、7月末までの進捗状況は約90%となり本工事もあとわずかとなりました。

エースモール推進工は全長170mと長距離のため、到達精度を上げるために下記の管理方法で、推進管の到達精度向上に努めました。その結果、水平・高低差ともに1cm程度に収めることができました。

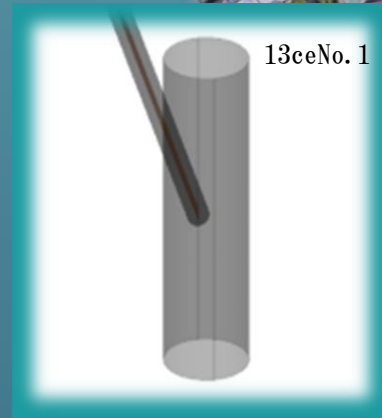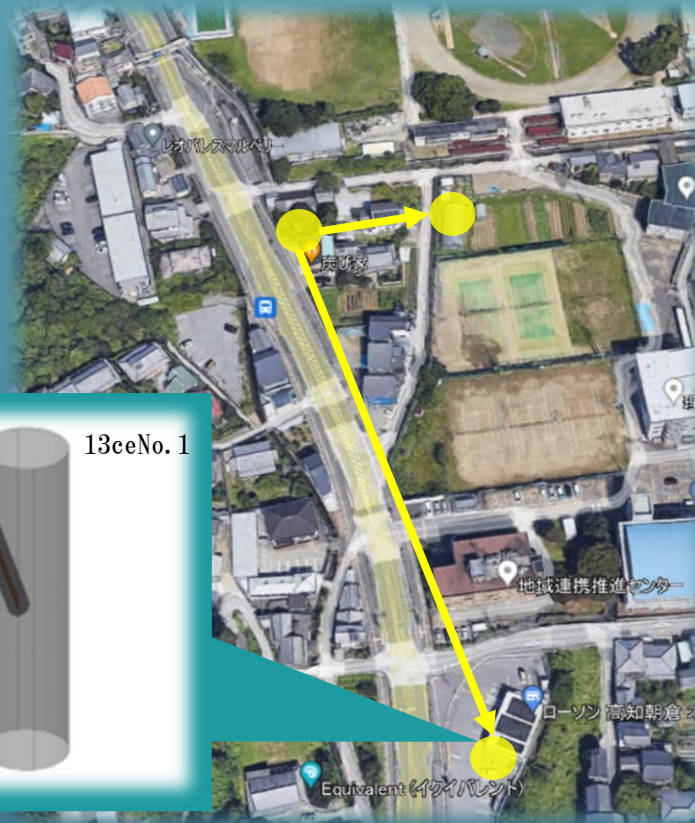

到達!?



## 推進管測定方法



電磁波レーダーによる測定



操作モニターによる測定

## SDGsの取り組み



今回も当現場で掲げたいいくつかの目標のうち、環境保全活動に関連する2つの活動についてご紹介します。



### 現場周辺の草引き

定期的に草引きを行うことで、見た目にもきれいで、通行する車両からも見通しの良い環境になりました。

### 快適トイレの設置

男女ともに快適に使用できる仮設トイレ、快適トイレを設置しています。更に当現場はトイレ周りに目隠しを設置しています。

